



**SAN PEDRO
DE JUJUY**

Un municipio de todos

PROVINCIA DE JUJUY



MESA DE ENTRADA

Expediente N° 0027-IM-2024

Entró el 02/09/2024

Iniciado por Intendente Municipal Dr. Julio César Bravo

ASUNTO:

Ref. Tasa Vial Municipal Fondo para el Mantenimiento
de la Red Urbana Municipal. Se adjunta este Informe
de Recaudación Bimestral. -

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE JUJUY MESA DE ENTRADA		MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE JUJUY MESA DE SALIDA		MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE JUJUY CONSEJO DE GOBIERNO	
ENTRO	SALIO	ENTRO	SALIO	ENTRO	SALIO
DIA 02-09-24	DIA 02-09-24	DIA 02-09-24	DIA 02-09-24	DIA 03	DIA 09
HORA 1240	HORA 1245	HORA 1300	HORA 1300	HORA 1400	HORA 1400
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]

NOTA Nº 204 -IM-2024.-

San Pedro de Jujuy, 02 Septiembre del 2024.-

AL PRESIDENTE DEL
CONCEJO DELIBERANTE
DR. MARCELO ARIEL CASTRO

S / D.-



Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de elevarle el Informe de recaudación Bimestral, Referente con lo establecido en Ordenanza 1379/2024, "TAZA VIAL MUNICIPAL FONDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MUNICIPAL", ART. Nº5, TITULO II ART. Nº 7 incorporación a la Ordenanza 314/1993, CAPITULO VII ART. Nº 367, informe detallado por los meses de JUNIO Y JULIO 2024 TASA VIAL MUNICIPAL.-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.-



[Signature]
JULIO CESAR BRAVO
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de San Pedro de Jujuy

02.09.24
5 1240
Mitre 297 - C.P. 4500
San Pedro de Jujuy - Jujuy - Argentina
03888 42 4200


MunicipioSPJ

@MunicipioSPJ

TASA VIAL MUNICIPAL
INFORME DE RECAUDACION BIMESTRAL



Estación de Servicio	Jun-24	Nº Recibo	Jul-24	Nº Recibo
YPF	5.030.575,89	276671	6.135.495,00	279930
GNC PUMA	2.818.547,38	276338	2.722.712,72	280223
Estac. Serv. Le Park SRL	6.952.576,00	276807	8.616.506,00	280278
Eco Gas San Pedro SRL	5.324.136,00	276809	6.189.892,00	280230
Las Centenarias SRL	3.023.516,00	276811	2.944.436,00	279944
GNC La Mariposa	331.000,00	276827	457.779,92	281036
Suministros Energéticos SRL	1.164.515,00	277015	1.413.066,00	280421
Alsina SRL	534.498,33	277922	560.898,68	280546
TOTAL RECAUDADO	25.179.364,60		29.040.786,32	


C.P.N. Cáceres Daniela
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Municipalidad de San Pedro de Jujuy



29 de agosto de 2024

INFORME BIMESTRAL



Trabajos realizados con Hormigón Elaborado H-21


- **Rotonda av. 9 de Julio**

Durante este periodo se realizó demolición y hormigonado de calzadas sobre la avenida 9 de julio, desde la calle Ayacucho hasta llegar a la calle Gorriti, también se comenzó con el hormigonado de 3 lomos de burros de los 5 proyectados.

Procesos realizados: Toma de niveles, preparación del terreno, demolición de calzada, moldeado y hormigonado.

Materiales Gastados:

- 141.20m³ de hormigón elaborado H-21.
- 10kg de alambre de n°16
- 10kg de alambre de n°14
- 10 kg de alambrón de n°6
- 402,3kg de Alquitrán.
- 5 barra de hierro liso macizo redondo de Ø20
- 23 barra de hierro torsionado de Ø12

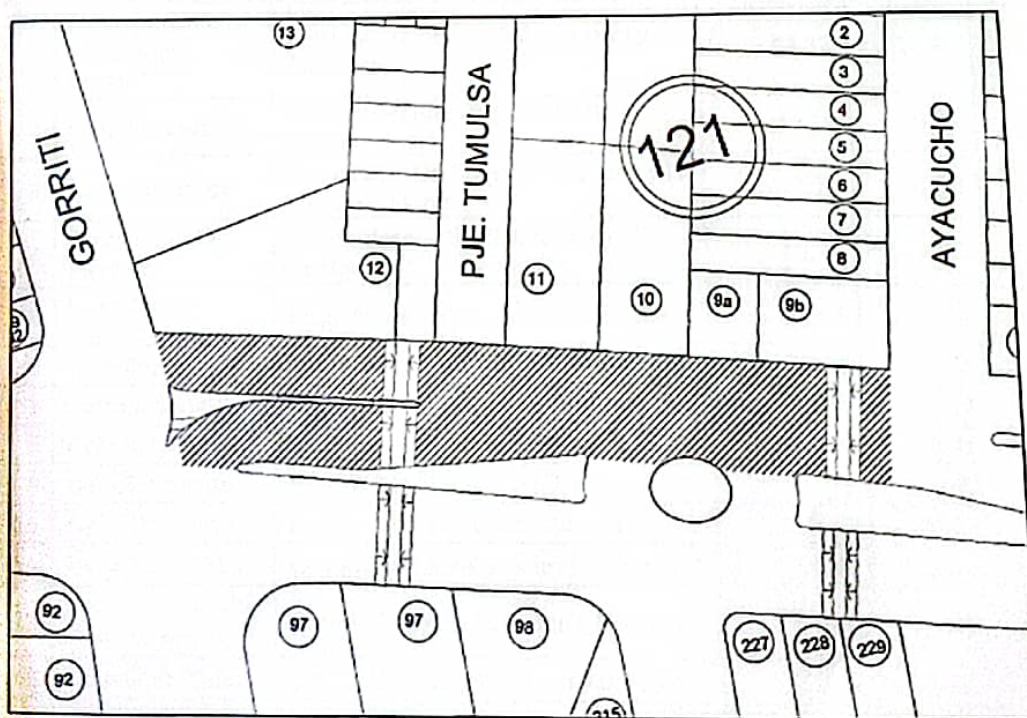

- **Bacheos en la Ciudad**

A continuación, se expresa un cuadro de bacheos realizados en diferentes sectores de la ciudad con una superficie total y cantidad de hormigón elaborado H-21 y sus respectivos croquis de ubicación.

Procesos realizados: Preparación del terreno, demolición de calzada, moldeado y hormigonado.

Cabe aclarar que en calle Humahuaca se realizó: cordón cuneta, rampa y bacheo.



<i>Esc. Almirante (Calle Humahuaca)</i>					
Obra	Largo	Ancho	Alto	M ²	M ³
Cordón	40.60	0.15	0.15		0.91
Cuneta	40.60	1.00	0.20	40.60	8.12
Rampa	1.10	1.40	0.80	1.54	1.23
Calzada	8.70	1.4	0.18	12.18	2.19
total				54.32	12.46

<i>Avda. Perón (entre calle Mateo y Alsina)</i>		
obra	mts lineales	M ³
Cordón cuneta y Baden	95,40	19.08

Item	Ubicación		Mts2	Mts3
	Calle	Dirección		
1	Calle Humahuaca - Esc. "Almirante Brown"	Entre calles Miguel M. de Guemes y Tucumán	54.32	12.46
2	Calle Holanda	Entre calles Almafuerte y R. del Libano	49.26	9.85
3	Avda. Libertador	Entre calles Dr. Roque Saenz Peña y P. S. Jose de Flores	7.90	1.58
4	Acceso A B° La Merced	Acceso desde calle B. Ovejero y Undiano	10.73	2.15
5	Calle Pedro Goyena	Entre calles Sarmiento y A. del Valle	21.65	4.33
6	Calle Conta	Entre calles V. Sarfield y B. Mitre	29.04	5.81
7	Serapio Soria	Entre calles V. Sarfield y B. Mitre	10.86	2.17
8	Calle B. Mitre	Entre calles A. del Valle y M. Aráoz	4.28	0.86
9	Calle Sarmiento	Entre calles R. Leach y J.B. Alberdi	3.51	0.70
10	Avda. Uruguay	Intersección con calle Paterson	129.20	25.84
11	Avda. Mateo 320	Entre calle J. Lens y calle N. Sallent	3.00	0.60
12	Avda. Sanchez de Bustamante	Entre calles P. del Carmen y Mirasoles	24.00	4.80
13	Calle Gdor. Tello	Entre calles Rogelio Leach y B. Mitre	81.20	16.24
14	Rotonda	Avda. 9 de julio	706	141.2
TOTAL DE HORMIGÓN ELABORADO H-21			1184.95	228.59


En la sumatoria de bacheos y los trabajos realizados en la Rotonda avda. 9 de julio, da un total de 228,59 mts³ de Hormigón Elaborado H-21.

También se utilizaron los siguientes materiales en la repavimentación de la avda. Uruguay y Paterson:

- 74 kg de alquitrán.
- 10kg de alambre de 16mm
- 10kg de alambre de 14mm
- 10 kg de alambrón de 6mm




➤ 1.- Croquis de Ubicación: Escuela Almirante n° 95

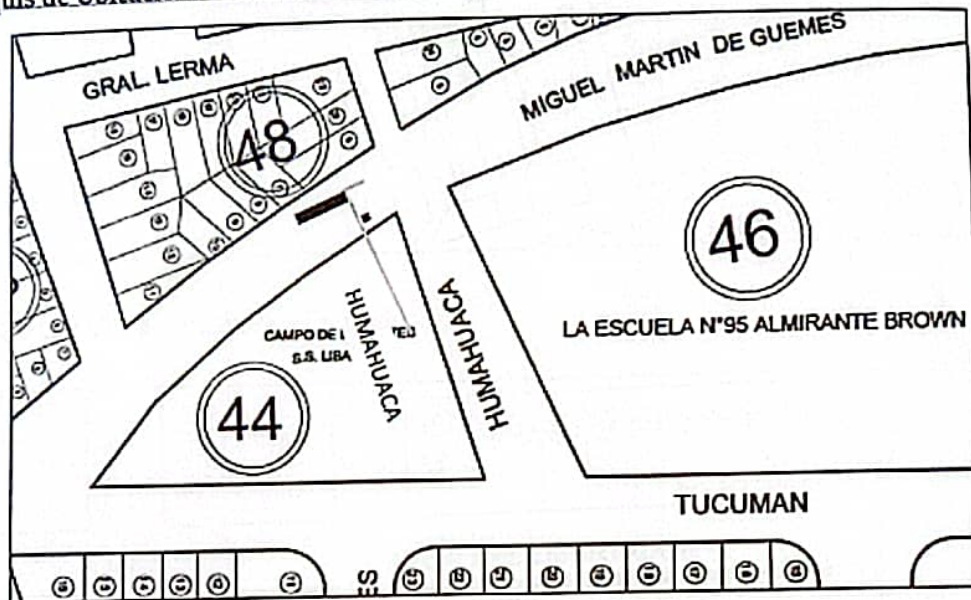


Tipo de Obra	Referencia
Cordón cuneta	
Calzada	
Rampa	


➤ 2.- Croquis de Ubicación: Calle Almafuerte y Holanda

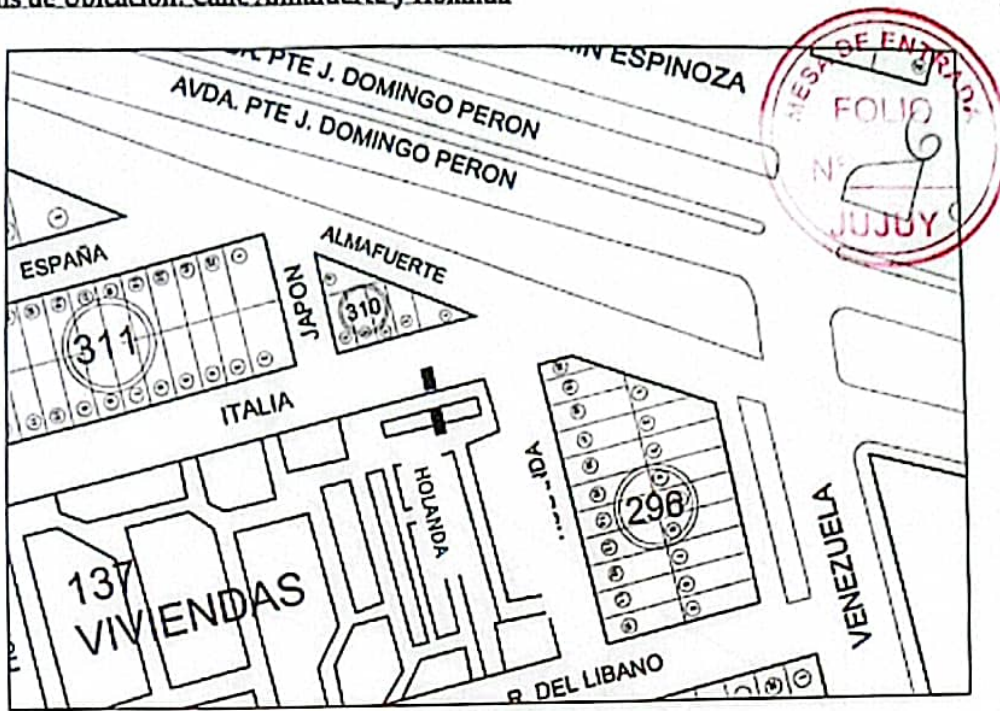


➤ 3.- Croquis de Ubicación: Ayda, Libertador

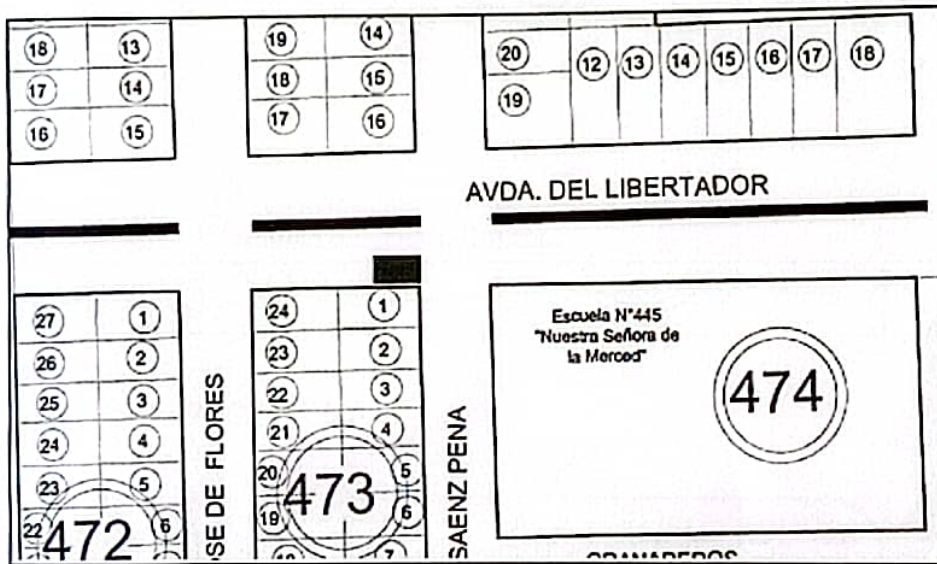


➤ 4.- Croquis de Ubicación: Acceso a Bº La Merced.

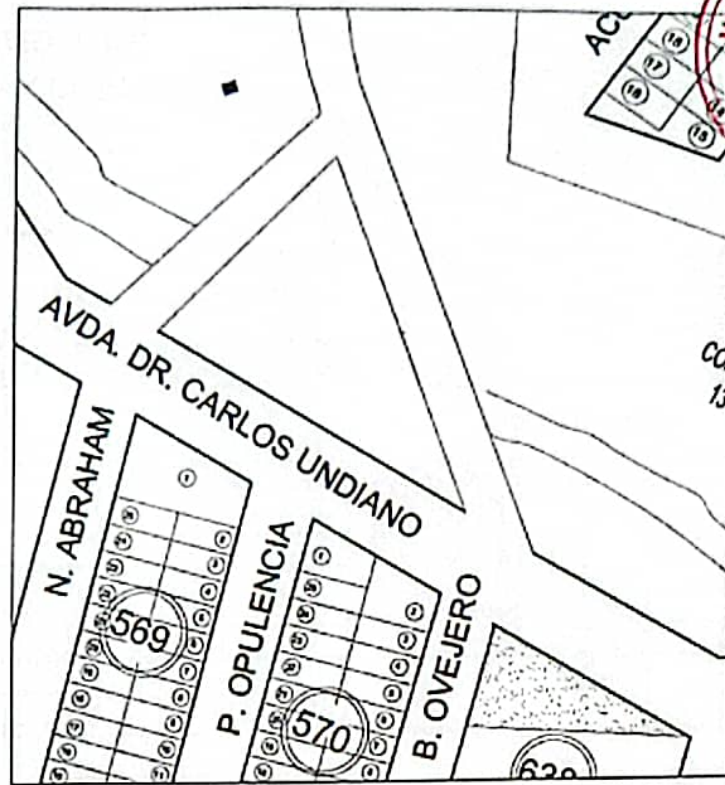

➤ 5.- Croquis de Ubicación: Calle Pedro Goyena.

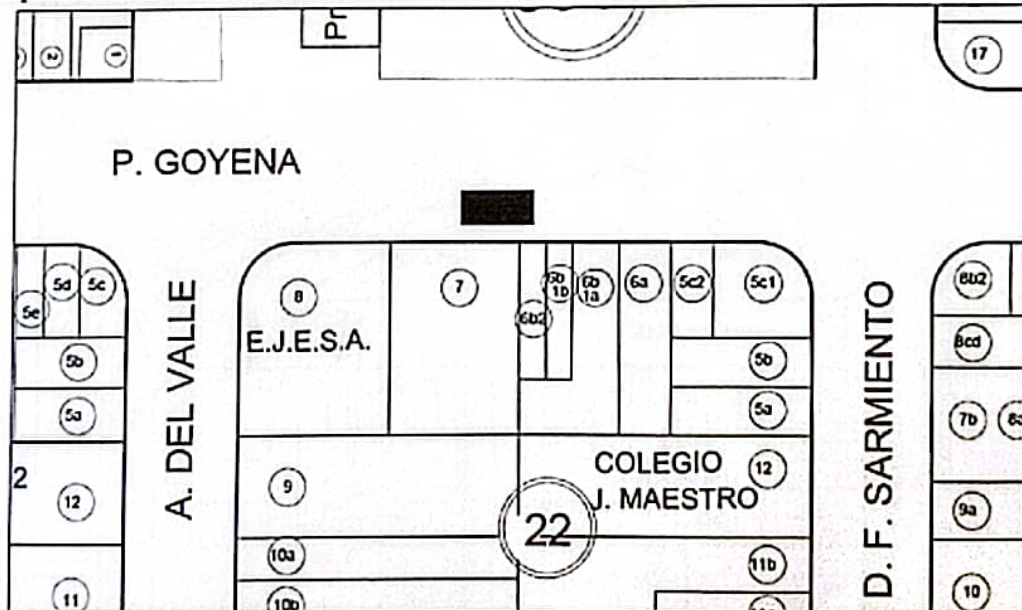


➤ 6.- Croquis de Ubicación: Calle Conta

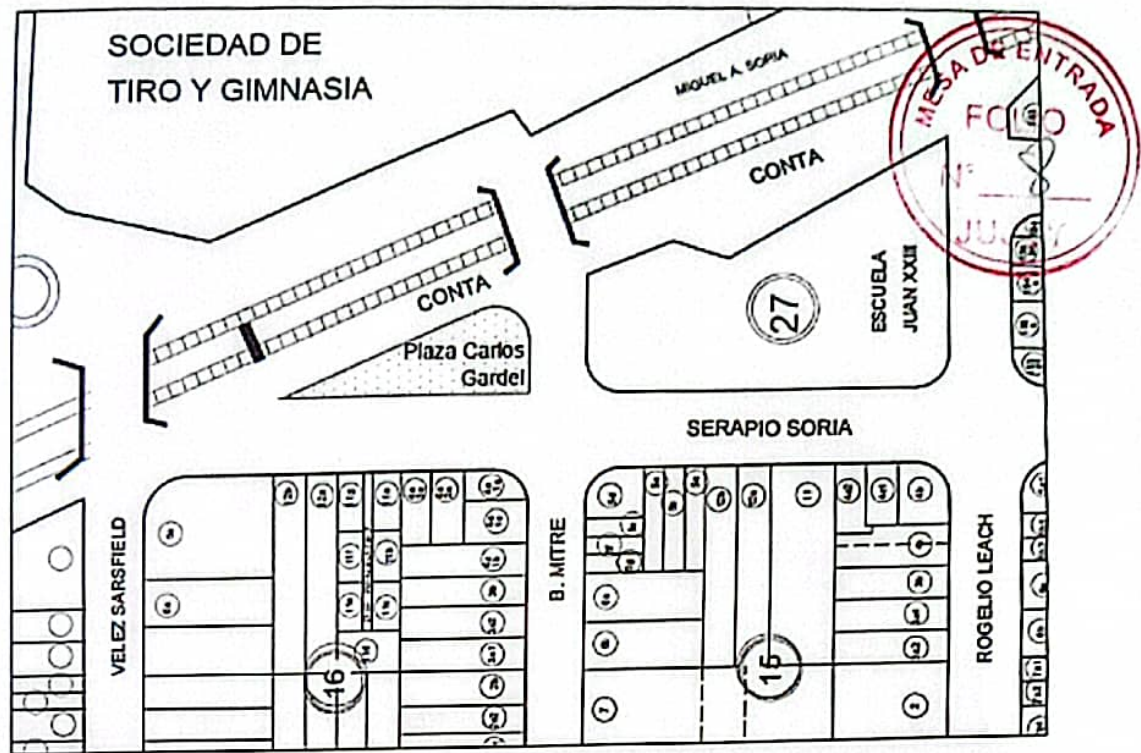


➤ 7.- Croquis de Ubicación: Calle Serapio Soria




8.- Croquis de Ubicación: Calle B. Mitre

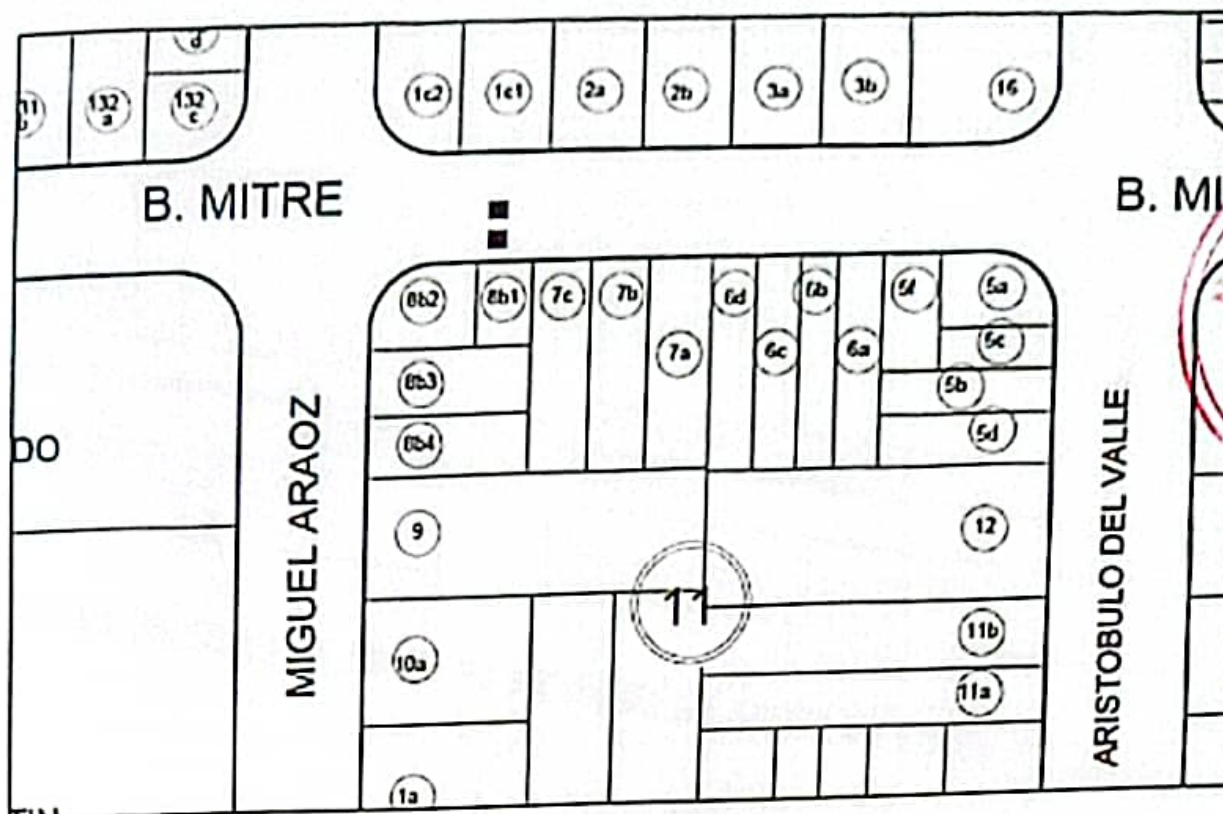


9.- Croquis de Ubicación: Calle Sarmiento

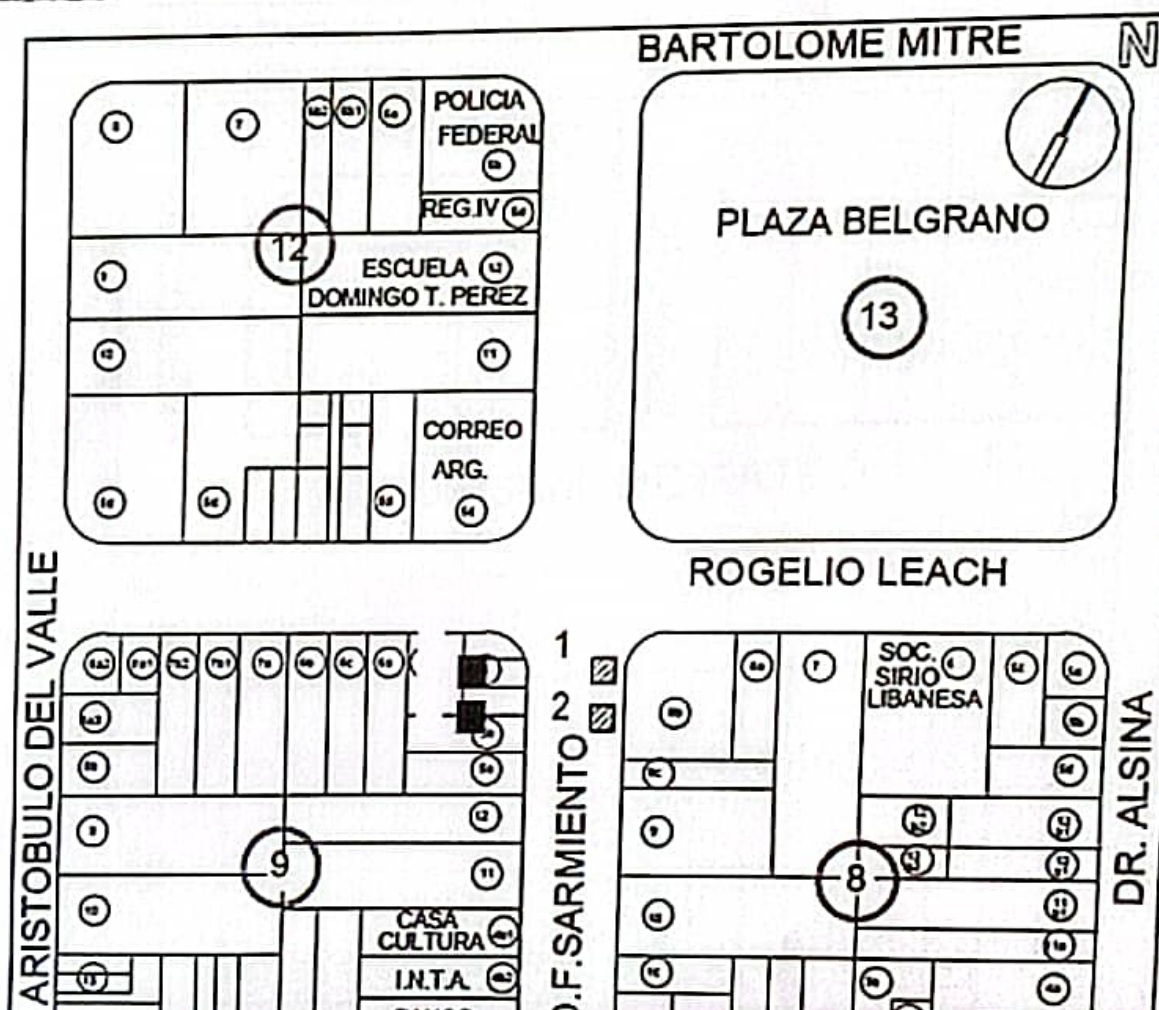

➤ 10.- Croquis de Ubicación: Avda. Uruguay

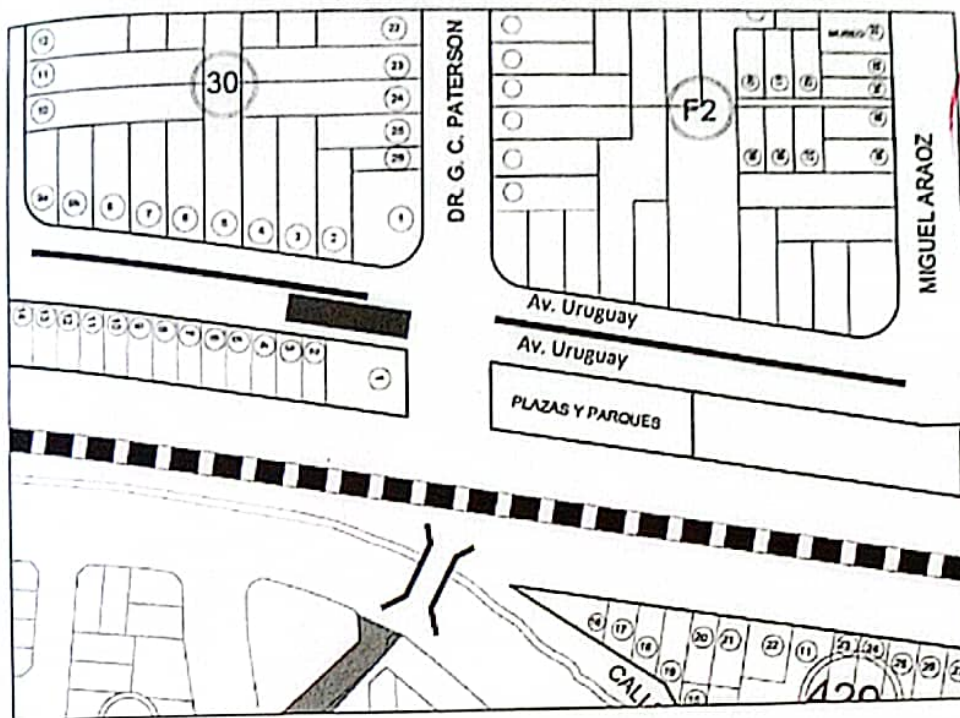


➤ 11.- Croquis de Ubicación: Avda. Mateo

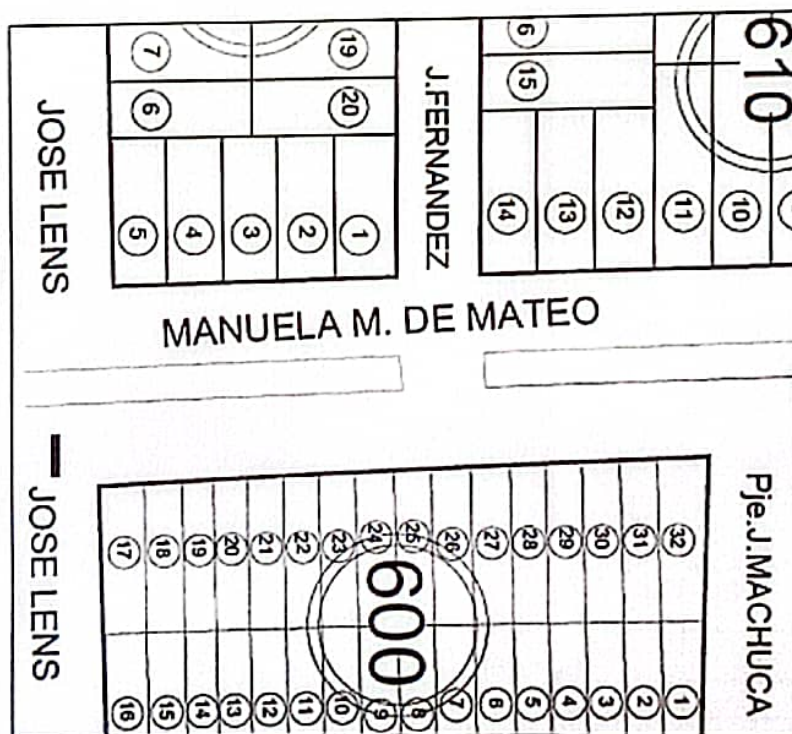


7 12.- Croquis de Ubicación: Ayda. Sanchez de Bustamante



➤ 13.- Croquis de Ubicación: Calle Gdor. Tello

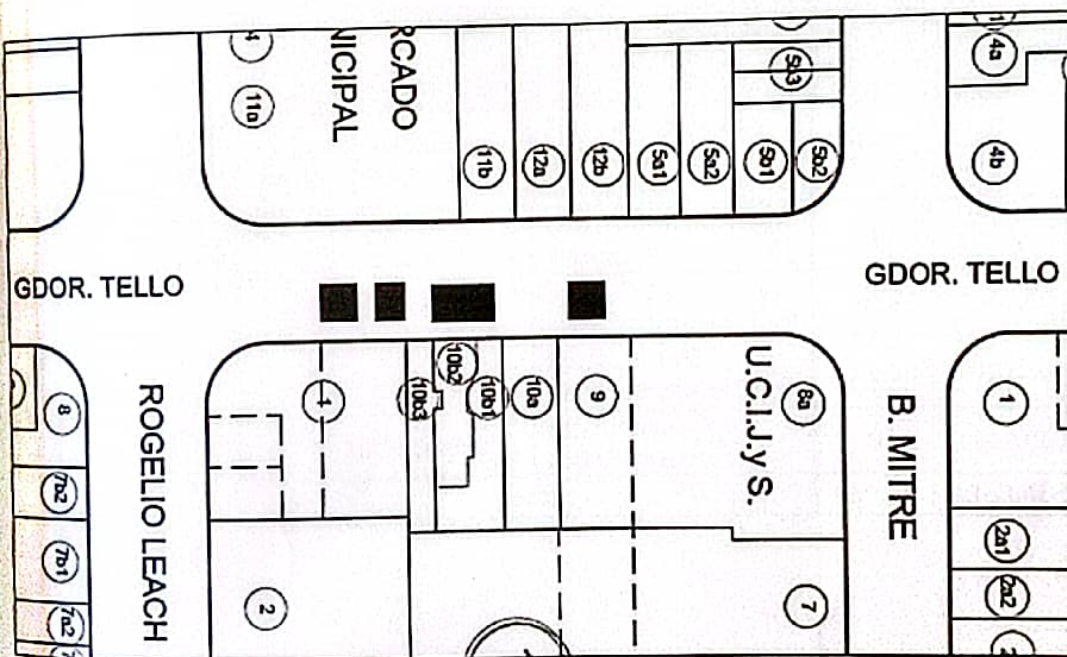

14.- Croquis de Ubicación: Calle Ecuador

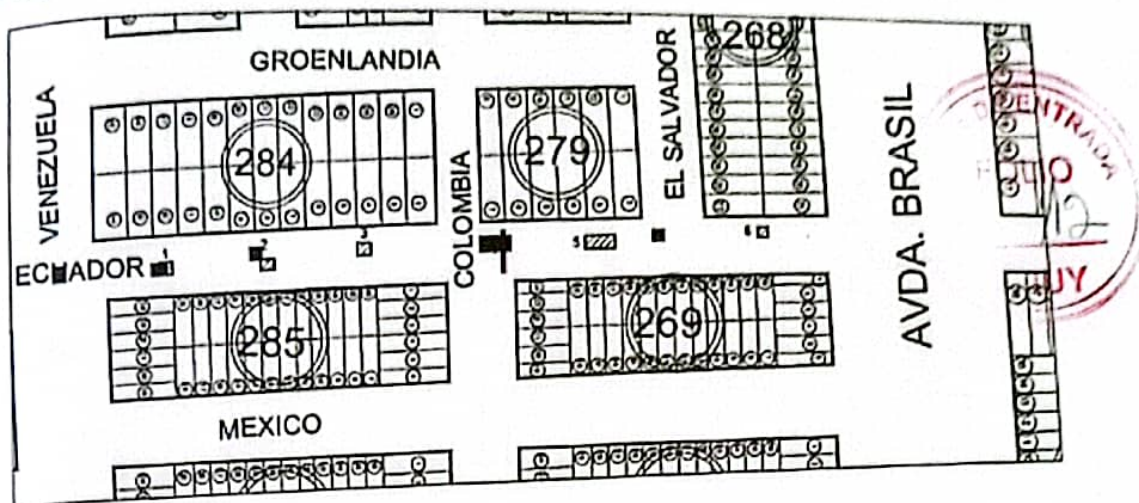


Trabajos realizados con asfalto frío


Se nombran a continuación las diferentes zonas, con sus respectivos croquis de ubicación indicando donde se realizaron las reparaciones de bacheos con asfalto frío.

Item	Calle	Ubicación	Mts2	Asfalto Frio (kg)
1	Avda. Sanches de Bustamante	Entre av. San Luis y calle Abraham Machicado	30.29	1817.40
2	Posta de Yatasto	Entre calles Dorrego y Arenales	34.00	2040.00
3	Canadá	Entre Avda. Brasil y avda. Venezuela	60.85	3651.00
4	Calle Jujuy	Entre calles G. Paterson y calle Salta	6.20	372.00
5	Groenlandia	Intersección con avda. Venezuela	8.05	483.00
Total			139.39	8363.40


➤ 1.- Croquis de Ubicación: Ayda. Sanchez de Bustamante

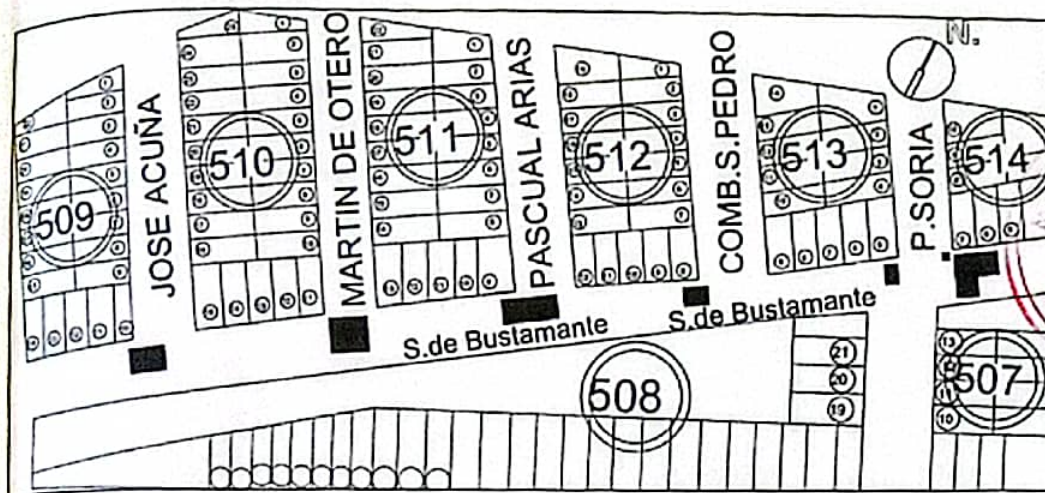


➤ 2.- Croquis de Ubicación: Calle Posta de Yatasto

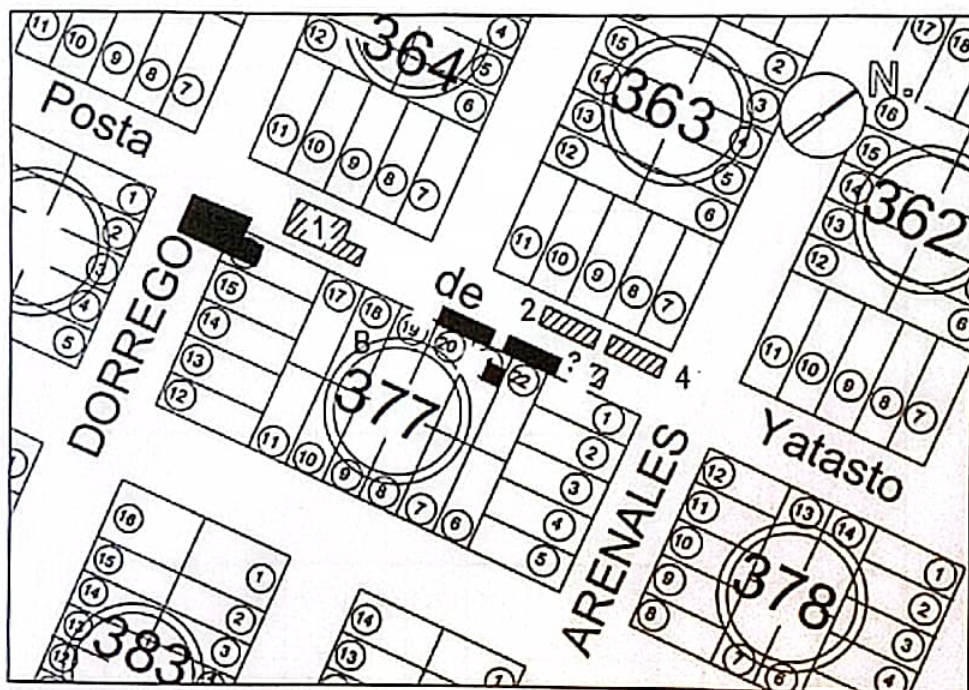


➤ 3.- Croquis de Ubicación: Calle Canadá

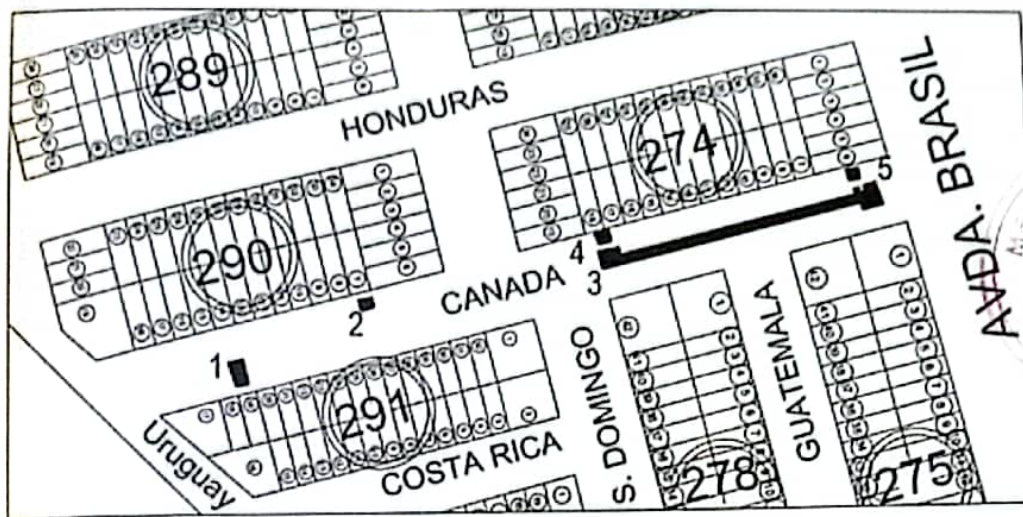

➤ 4.- Croquis de Ubicación: Calle Jujuy

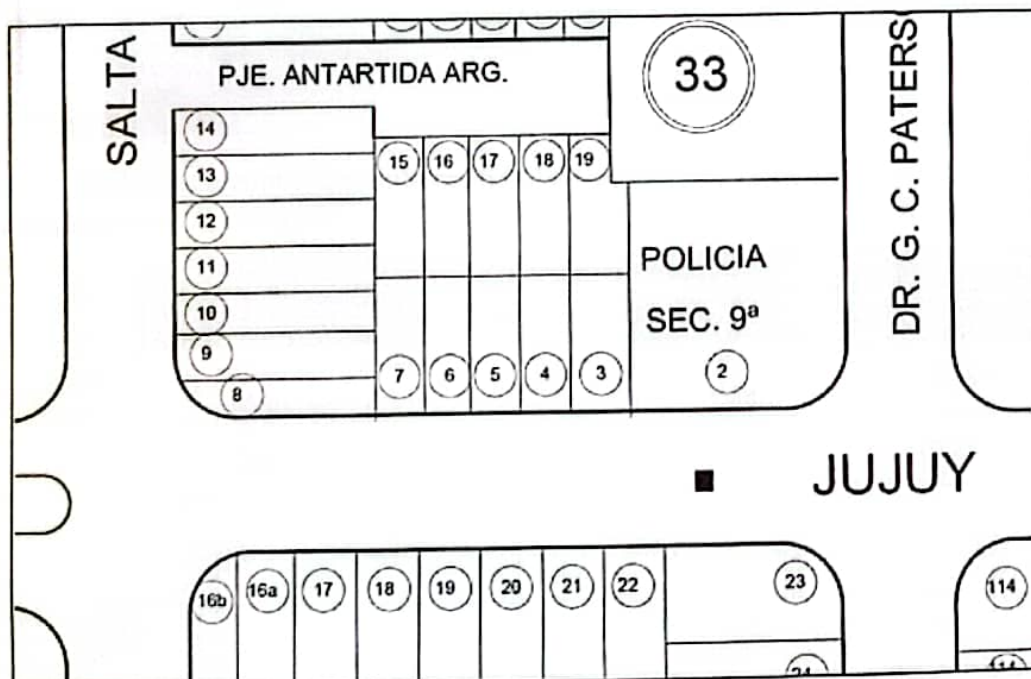

5.- Croquis de Ubicación: Calle Groenlandia y avda. Venezuela

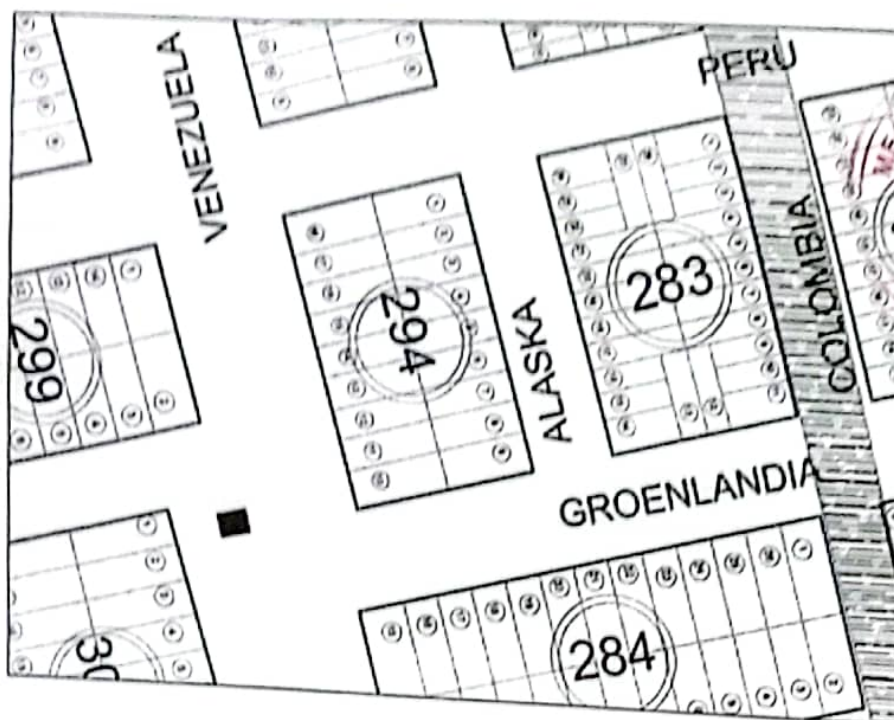

Antisol Normalizado

Se detalla a continuación la cantidad de antisol que se utilizó en cada los trabajos realizados con su respectiva ubicación.

Item	Calle	Ubicación	Mts2	Antisol (lts)
1	Calle Humahuaca - Esc. "Almirante Brown"	Entre calles Miguel M. de Guemes y Tucumán	12.18	3.65
2	Calle Holanda	Entre calles Almafuerte y R. del Libano	49.26	14.78
3	Avda. Libertador	Entre calles Dr. Roque Saenz Peña y P. S. Jose de Flores	7.90	2.37
4	Acceso A B° La Merced	Acceso desde calle B. Ovejero y Undiano	10.73	3.22
5	Pedro Goyena	Entre calles Sarmiento y A. del Valle	21.65	6.49
6	Conta	Entre calles V. Sarfield y B. Mitre	29.04	8.71
7	Serapio Soria	Entre calles V. Sarfield y B. Mitre	10.86	3.26
8	B. Mitre	Entre calles A. del Valle y M. Aráoz	4.28	1.29
9	Sarmiento	Entre calles R. Leach y J.B. Alberdi	3.51	1.05
10	Avda. Uruguay	Intersección con calle Paterson	129.20	38.76
11	Avda. Mateo 320	Entre calle J. Lens y calle N. Sallent	3.00	0.90
12	Avda. Sanchez de Bustamante	Entre calles P. del Carmen y Miraflores	24.00	7.20

13	Gdor. Tello	Entre calles Rogelio Leach y B. Mitre	81.20	24.36
14	Calle Ecuador	Avda. Brasil y avda. Venezuela	1.75	0.53
15	Rotonda	Avda. 9 de julio	706.00	211.80
TOTAL DE HORMIGÓN ELABORADO H-21			1094.56	371.20

El total de Antisol que se utilizó durante el periodo bimestral es de 328.37 litros.



Limpieza y otros trabajos realizados

Se realizaron arreglos de calles, limpieza de escombros, nivelación de terreno con máquina motoniveladora, máquina retropala y camión volquete, en diferentes sectores de la ciudad, que se mencionan a continuación.

- Rotonda Avda. 9 de Julio.
- Avda. Uruguay y calle Paterson.
- Escuela Almirante Brown n° 95.
- Feria Frutihortícola del Ramal (Cordón Cuneta).
- B° Prolongación Baldwin
- B° San Antonio
- B° 17 de Agosto
- Calle Conta
- Calle Serapio Soria
- Calle Holanda
- Avda. Libertador
- Acceso A B° La Merced
- Calle Pedro Goyena
- Calle Bartolomé Mitre
- Calle Sarmiento
- Avda. Mateo
- Avda. Sanchez de Bustamante
- Calle Gdor. Tello
- Calle Almafuerte y Holanda
- Barrio 25 de mayo.
- Barrio N. Kirchner
- Barrio P. Perón
- 14 de diciembre
- Barrio Soledad
- Barrio Tupac

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (JUNIO - JULIO)					
Tipo de Combustible	Unidad	Vehiculo	Jun-24	Jul-24	Consumo Total
Gasol Premium	88	Motoniveladora	1092	0	
Gasol Premium	113	Motoniveladora	1551	1522	
Gasol Premium	104	Retroexcavadora	500	696	

	108	Retroexcavadora	619	561	
Gasoil Premium			2670	2779	
Consumo Gral.					
	93	Vibro Compactador	15	0	
Gasoil Super			420	510	
Gasoil Super	Sr. Diaz	Camion Volquete	975	1444	
Gasoil Super	Sr. Morata	Camion Batea	571	660	
Gasoil Super	Sr. Pereyra	Camion Regador	1981	2614	
Consumo Gral.			46	54	
Nafta Super	Sr Pereyra	Bomba P/ Regador	46	54	
Consumo Gral.			4697	5447	
Consumo Parcial					
Consumo Total					10144





MUNICIPALIDAD DE
**SAN PEDRO
DE JUJU**

DIRECCION DE PLANEAMIENTO
HIPOLITO YRIGOYEN ESQ. ARISTOBULO DEL VALLE - SAN PEDRO DE JUJU



PAVIMENTO		JUNIO/JULIO 2024			
N°	Descripcion	Un	Cantidad	P.U. material	TOTAL MAT.
					54.382.736,00
1	Bacheo y rotonda calle Urquiza con H° elaborado	m3	228,59	90.000,00	20.573.100,00
2	Cordón cuneta y badén con H° elaborado	m3	19,08	90.000,00	1.717.200,00
3	Asfalto en frío (139,39m2)	kg	8.363,40	330,00	2.759.922,00
4	Combustible	lts	10.144,00	1.361,00	13.805.984,00
5	Alambre negro N° 14	kg	20,00	3.500,00	70.000,00
6	Alambre negro N° 16	kg	20,00	3.500,00	70.000,00
7	Alambrón Ø 6mm	kg	20,00	3.500,00	70.000,00
8	Alquitrán	kg	476,30	2.300,00	1.095.490,00
9	Hierro liso Ø 20mm	un	5,00	51.700,00	258.500,00
10	Hierro torsionado Ø 12mm	un	23,00	18.500,00	425.500,00
11	Antisol	m2	371,20	6.700,00	2.487.040,00
12	Logística: traslado del personal, seguridad vial, alumbrado (reflectores, columnas, artefactos, cableado subterráneo, etc.)	gl	1,00	6.350.000,00	6.350.000,00
13	Maquinarias (motoniveladora, retroexcavadora, camiones volquetes, batea, vibrocompactador, etc.)	gl	1,00	4.700.000,00	4.700.000,00
No se computa la mano de obra del personal municipal.					

Ing. Gustavo Javier Jura
Secretario de Obras y Servicios
Públicos y Medio Ambiente
Municipalidad de San Pedro (J)

Arq. María Julia Sanchez
DIRECTORA PLANEAMIENTO
MUN. DE SAN PEDRO DE JUJU
